TABLEAU DE BORD DE PILOTAGE PROJET

LE PROJET QUI DÉRAILLE

UNE PLATEFORME DE STREAMING (FILMS, SÉRIES)

Vous êtes architectes SI dans une startup qui explose : StreamFlow

Situation actuelle :

- 200 000 utilisateurs actifs
- une équipe de 12 développeurs
- 1 chef de projet
- déploiement toutes les semaines

MAIS…

Depuis 3 mois :

- les utilisateurs se plaignent
- les bugs explosent
- les temps de réponse augmentent
- le projet prend du retard

Dev :

> *"On passe notre temps à corriger des bugs…"*

CEO :

> *"Pourquoi les utilisateurs partent ?!"*

DevOps :

> *"Les serveurs tiennent plus la charge…"*

LE VRAI PROBLÈME

Ils ont :

- Jira
- logs
- métriques
- monitoring

MAIS : AUCUNE VISION GLOBALE

Qu'est-ce qui manque ?

Un tableau de bord de pilotage

RÔLE ET OBJECTIF D'UN TABLEAU DE BORD

Un tableau de bord de pilotage projet c'est :

> un dispositif de suivi composé d'indicateurs (**KPI**) permettant de mesurer l'état d'un projet, d'anticiper les dérives et de prendre des décisions.

FINALITÉS PRINCIPALES

Un dashboard doit permettre :

1. **Suivre** : état actuel du projet
2. **Comparer** : prévu vs réel
3. **Alerter** : détection des anomalies
4. **Décider** : actions correctives

EXEMPLE CONCRET

Projet : développement d'une application mobile bancaire

Le chef de projet regarde un dashboard :

Avancement prévu : 60%
Avancement réel : 40%

Sans dashboard :

"On est un peu en retard..."

Avec dashboard :

"On a 20% de retard → il faut agir immédiatement"

Décision :

ajouter 2 développeurs
réduire le scope du sprint

DIFFÉRENCE FONDAMENTALE : REPORTING VS PILOTAGE

Reporting	Pilotage
Statique	Dynamique
Informer	Décider
Passé	Présent + futur

EXEMPLE

Rapport mensuel PDF :

30 pages
chiffres détaillés

Résultat :
Personne ne le lit

Dashboard en temps réel :

5 KPI clés
alertes visuelles

Résultat :
Décision en 5 minutes

LES KPI : DÉFINITION

Un KPI est une mesure quantifiable permettant d'évaluer la performance d'un processus par rapport à un objectif.

CARACTÉRISTIQUES D'UN BON KPI (SMART ÉTENDU)



Le SMART étendu :

Spécifique

Mesurable

Actionnable

Fiable

Temporel

MAUVAIS VS BON KPI

Mauvais :

"Nombre de lignes de code"

=> inutile pour décider

Bon :

"Taux d'erreur API"

=> actionnable immédiatement

KPI PROJET (GESTION)

AVANCEMENT PROJET (%)

FORMULE

Avancement=Travail réalisé/Travail total×100

EXEMPLE RéEL

- 120 tâches prévues
- 60 terminées

60/120×100=50%

UTILITé

- suivi planning
- communication direction

LIMITE

toutes les tâches n'ont pas le même poids

CAS RÉEL

Une équipe valide :

- 10 petites tâches → 50%
- MAIS la tâche critique n'est pas faite

=> faux sentiment d'avancement

BURN-DOWN CHART (AGILE)

PRINCIPE

Représente :

- travail restant
- vs temps

EXEMPLE RÉEL

Sprint de 10 jours :

Jour	Travail restant
1	100
5	90
10	80

problème évident :
aucune progression

INTERPRÉTATION

- courbe descend : OK
- courbe plate : blocage
- courbe monte : dérive

DÉCISION

- identifier blocage
- réallouer ressources

VÉLOCITÉ (AGILE)

FORMULE

Velocite=Story points terminés par sprint\

EXEMPLE RÉEL

Sprint	Points
S1	30
S2	28
S3	15

ANALYSE

chute brutale = alerte

CAS RÉEL ENTREPRISE

Une équipe voit sa vélocité chuter :

cause :

- bugs en production
- interruptions fréquentes

DÉCISION

- stabiliser production
- geler nouvelles features

KPI QUALITÉ

TAUX DE BUGS

FORMULE

Bug Rate=Nombre de bugs/Nombre de fonctionnalités

EXEMPLE RÉEL

- 40 features
- 30 bugs

0.75 : très mauvais

CAS RÉEL

une startup sort une feature de paiement

Résultat :

- 15 bugs critiques
- perte de clients

problème :
absence de KPI qualité

TAUX DE CORRECTION DES BUGS

FORMULE

Fix Rate=Bugs corrigés/Bugs détectés×100

⁄⁄ EXEMPLE

- 100 bugs détectés
- 60 corrigés

=>60%

INTERPRÉTATION

Valeur	Lecture
> 90%	bon
70–90%	moyen
< 70%	critique

⚠ DÉCISION

- prioriser correction
- stopper nouvelles features

COUVERTURE DE TESTS

FORMULE

Coverage=Code testé/Code total×100

⚠ EXEMPLE

- 800 lignes testées
- 1000 lignes total

=>80%

IMPORTANT

100% coverage ≠ 0 bug

⚠ CAS RÉEL

Projet avec 90% coverage
MAIS bugs critiques

cause :

- tests mal conçus

KPI TECHNIQUES

TAUX D'ERREUR

FORMULE

Error Rate=Requêtes en erreur/Requêtes totales×100

EXEMPLE RÉEL

API paiement :

- 2% erreurs

impact :

- transactions échouées
- perte revenue

TEMPS DE RÉPONSE (LATENCE)

FORMULE

Temps moyen=∑temps/nombrederequêtes

NIVEAU AVANCÉ

utiliser :

- P50
- P95
- P99

CAS RÉEL

- moyenne = 300ms
- P95 = 2s

problème caché

DISPONIBILITÉ (UPTIME)

FORMULE

Uptime=Temps de fonctionnement/Temps total×100

EXEMPLE

- 30 jours = 720h
- 2h down

718/720=99.72%

INTERPRÉTATION

Niveau	Signification
99%	faible
99.9%	standard
99.99%	critique

CAS RÉEL

AWS panne région : services indisponibles

KPI BUSINESS

POURQUOI LES KPI BUSINESS SONT ESSENTIELS ?

Un projet IT **n'existe pas pour le code**
Il existe pour **créer de la valeur**

EXEMPLE RÉEL

Une équipe améliore :

- performance API
- couverture tests

MAIS :

- les utilisateurs quittent la plateforme

Conclusion :

le projet est techniquement bon, mais business KO

TAUX DE CHURN (PERTE UTILISATEURS)

FORMULE

Churn Rate=Utilisateurs perdus/Utilisateurs totaux×100

EXEMPLE

- 10 000 utilisateurs début mois
- 2 000 quittent

2000/10000×100=20%

INTERPRÉTATION

Valeur	Lecture
< 5%	bon
5–10%	attention
> 10%	critique

CAS RÉEL

Plateforme streaming :

- churn augmente brutalement

investigation :

- bugs lecture vidéo
- latence élevée

lien direct :

KPI technique => KPI business

DÉCISION

- prioriser stabilité
- rollback features

TAUX DE RÉTENTION

FORMULE

Retention=Utilisateurs actifs après période/Utilisateurs initiaux×100

EXEMPLE

- 1 000 nouveaux utilisateurs
- 600 reviennent après 7 jours

=>60%

LECTURE

fidélité produit

CAS RÉEL

App mobile :

- bonne acquisition
- mauvaise rétention

problème UX / bugs

ARPU (REVENU MOYEN PAR UTILISATEUR)

FORMULE

ARPU=Revenu total/Nombre d'utilisateurs

EXEMPLE

- 50 000€
- 10 000 users

5€/user

CAS RÉEL

amélioration UX => plus de temps passé
plus d' achats => ARPU augmente

TAUX DE CONVERSION

FORMULE

Conversion=Utilisateurs ayant réalisé une action/Utilisateurs totaux×100

EXEMPLE

- 10 000 visiteurs
- 500 abonnements

=>5%

CAS RÉEL

bug paiement → conversion chute

KPI DEVOPS

DORA METRICS (STANDARD MONDIAL)

DEPLOYMENT FREQUENCY

DATA

Nombre de déploiements par période

EXEMPLE

- 1 deploy / semaine : lent
- 10 deploy / jour : rapide

CAS RÉEL

faible fréquence = pipeline bloqué

LEAD TIME

DATA

Temps entre commit et production

EXEMPLE

- commit lundi
- prod vendredi

=> 4 jours

OBJECTIF

réduire au maximum

MTTR (MEAN TIME TO RECOVERY)

FORMULE

MTTR=Temps total incidents/Nombre d'incidents

EXEMPLE

- 4 incidents
- total 8h

=>2h

CAS RÉEL

panne API paiement :

- MTTR élevé => perte argent

CHANGE FAILURE RATE

FORMULE

CFR=Déploiements échoué/Déploiements totaux×100

EXEMPLE

- 20 deploys
- 5 échouent

=>25%

INTERPRÉTATION

Valeur	Lecture
< 10%	bon
10–20%	moyen
> 20%	mauvais

CONSTRUIRE UN DASHBOARD INTELLIGENT

PRINCIPE FONDAMENTAL

Un dashboard ≠ liste de KPI

Un dashboard = **logique de décision**

MÉTHODE

1. IDENTIFIER L'UTILISATEUR

Rôle	Besoin
CEO	business
CTO	technique
PM	projet

2. LIMITER LES KPI

Règle :

5 à 10 KPI MAX

3. STRUCTURER VISUELLEMENT

STRUCTURE TYPE

LIGNE 1 : VISION GLOBALE

- avancement
- santé projet

LIGNE 2 : PROBLÈMES

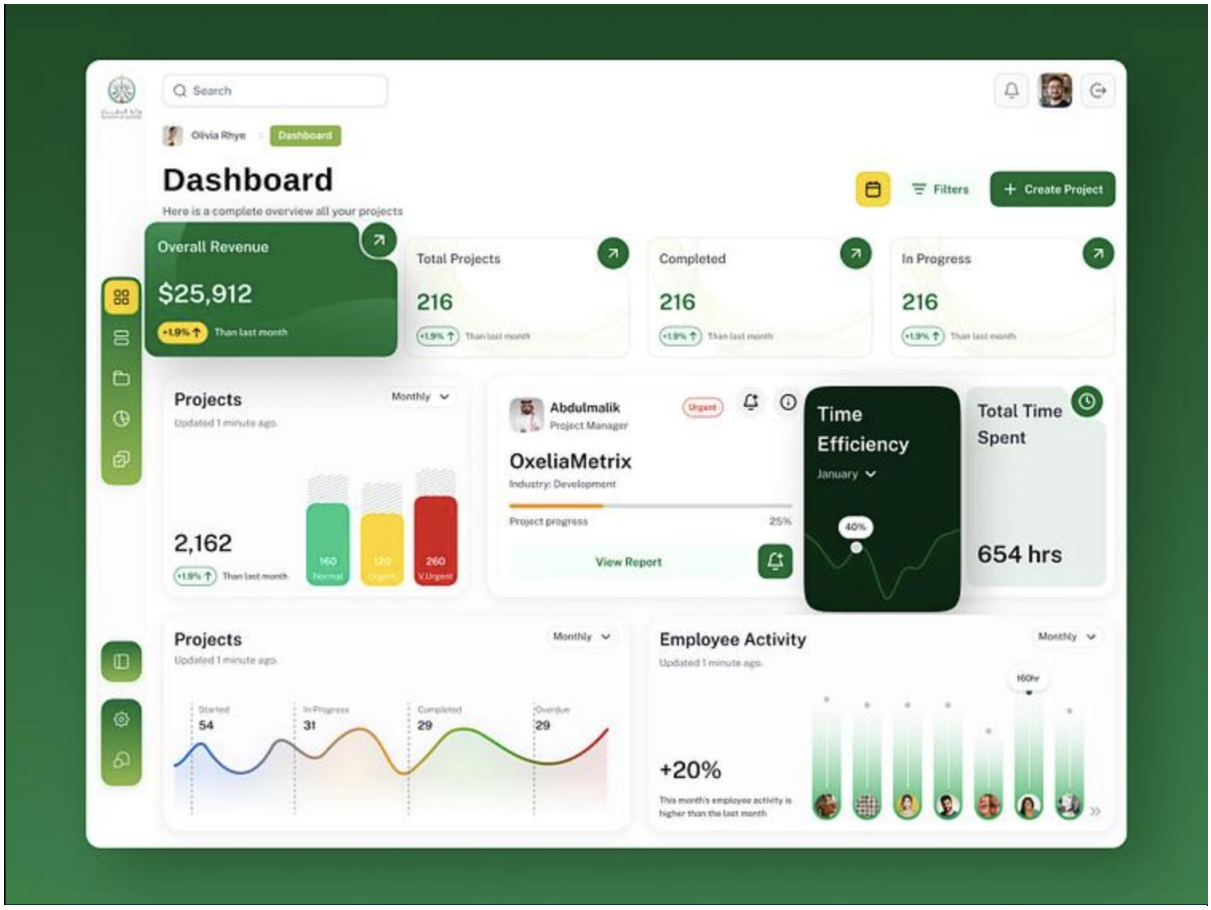
- bugs
- erreurs

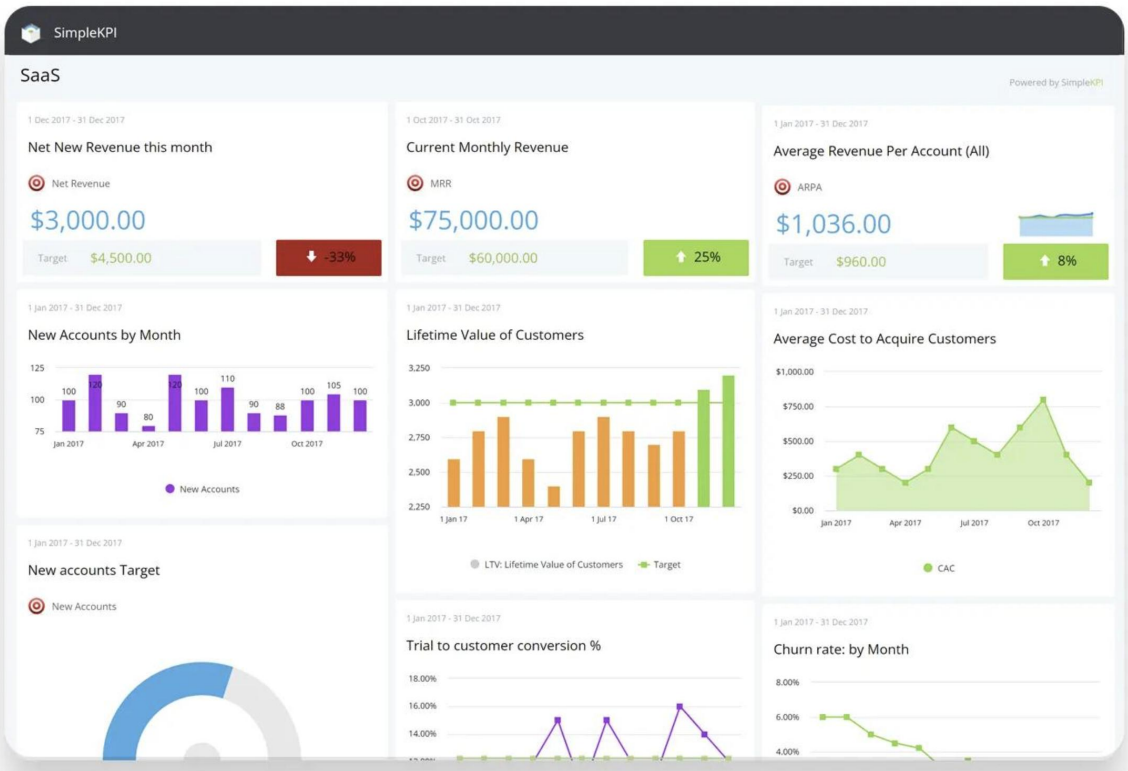
LIGNE 3 : TECHNIQUE

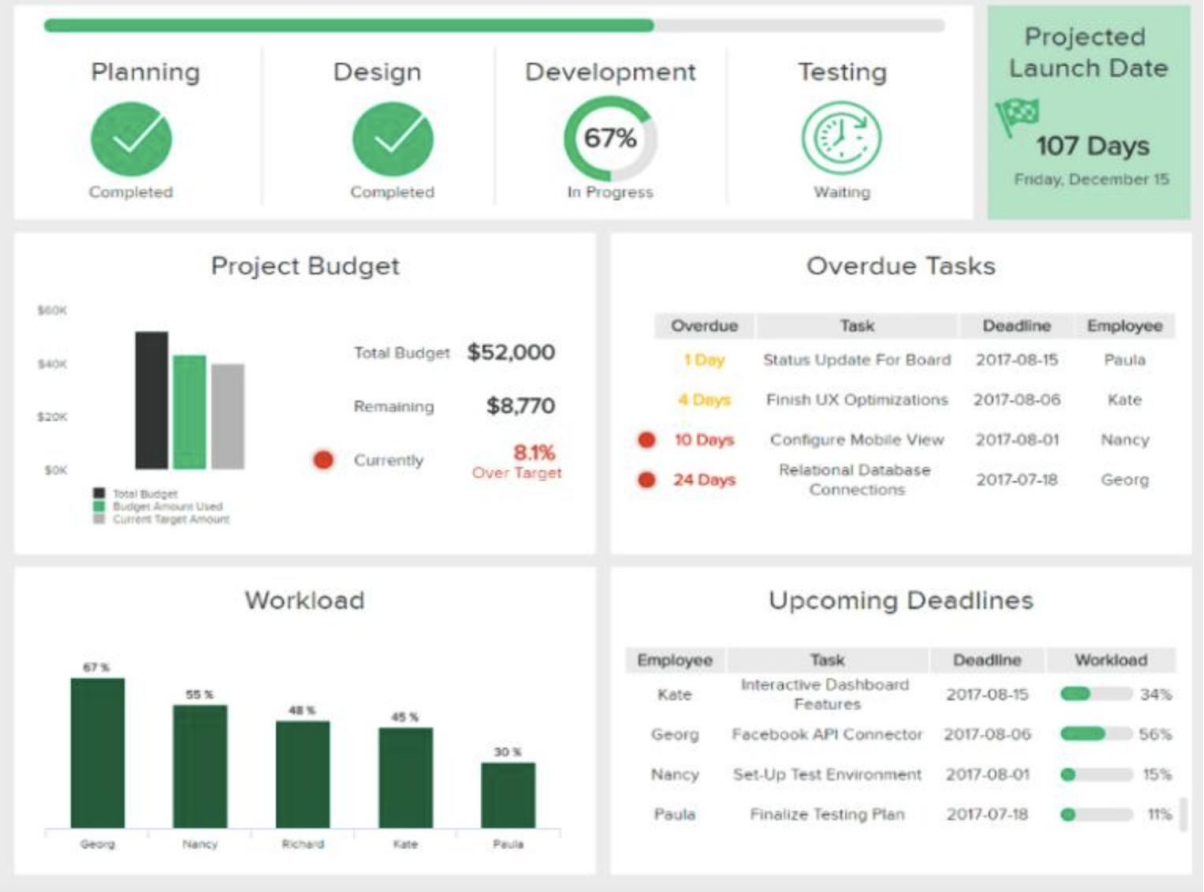
- performance
- uptime

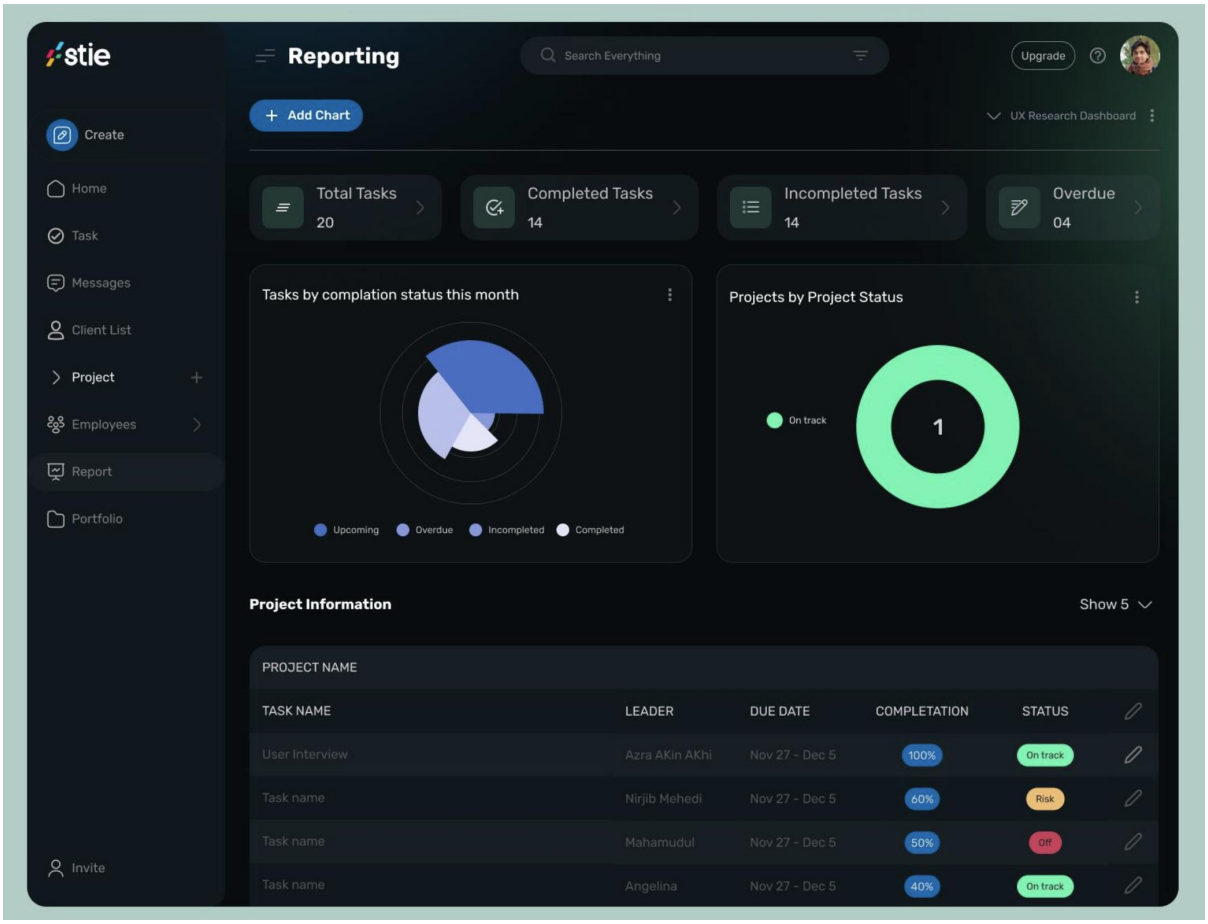
LIGNE 4 : BUSINESS

- churn
- conversion


Search
Olivia Rhye
Dashboard
Dashboard
Here is a complete overview all your projects
Filters
Create Project
Overall Revenue
$25,912
Total Projects
216
Completed
216
In Progress
216
Projects
Monthly
2,162
Abdulmalik
Project Manager
Urgent
OxeliaMetrix
Industry: Development
Project progress
25%
View Report
Time Efficiency
January
40%
Total Time Spent
654 hrs
Projects
Monthly
Started
54
In Progress
31
Completed
29
Overdue
29
Employee Activity
Monthly
+20%
This month's employee activity is higher than the last month


SimpleKPI
SaaS
Powered by SimpleKPI
Net New Revenue this month
Net Revenue
$3,000.00
Target $4,500.00
-33%
Current Monthly Revenue
MRR
$75,000.00
Target $60,000.00
25%
Average Revenue Per Account (All)
ARPA
$1,036.00
Target $960.00
8%
New Accounts by Month
New Accounts
Lifetime Value of Customers
LTV: Lifetime Value of Customers
Target
Average Cost to Acquire Customers
CAC
New accounts Target
New Accounts
Trial to customer conversion %
Churn rate: by Month


Planning
Completed
Design
Completed
Development
67%
In Progress
Testing
Waiting
Projected Launch Date
107 Days
Friday, December 15
Project Budget
$60K
$40K
$20K
$0K
Total Budget Amount Used
Current Target Amount
Total Budget $52,000
Remaining $8,770
Currently 8.1% Over Target
Overdue Tasks
Overdue Task Deadline Employee
1 Day Status Update For Board 2017-08-15 Paula
4 Days Finish UX Optimizations 2017-08-06 Kate
10 Days Configure Mobile View 2017-08-01 Nancy
24 Days Relational Database Connections 2017-07-18 Georg
Workload
67 %
55 %
48 %
45 %
30 %
Georg
Nancy
Richard
Kate
Paula
Upcoming Deadlines
Employee Task Deadline Workload
Kate Interactive Dashboard Features 2017-08-15 34%
Georg Facebook API Connector 2017-08-06 56%
Nancy Set-Up Test Environment 2017-08-01 15%
Paula Finalize Testing Plan 2017-07-18 11%


stie
Reporting
Search Everything
Upgrade
Add Chart
UX Research Dashboard
Create
Home
Task
Messages
Client List
Project
Employees
Report
Portfolio
Invite
Total Tasks 20
Completed Tasks 14
Incompleted Tasks 14
Overdue 04
Tasks by complation status this month
Upcoming
Overdue
Incompleted
Completed
Projects by Project Status
On track
1
Project Information
Show 5
PROJECT NAME
TASK NAME LEADER DUE DATE COMPLETATION STATUS
User Interview Azra AKin AKhi Nov 27 - Dec 5 100% On track
Task name Nirjib Mehedi Nov 27 - Dec 5 60% Risk
Task name Mahamudul Nov 27 - Dec 5 50% Off
Task name Angelina Nov 27 - Dec 5 40% On track

ERREURS POSSIBLES

KPI CONTRADICTOIRES

Exemple :

- augmenter vitesse
- MAIS qualité chute

KPI SANS ACTION

Si tu ne sais pas quoi faire => inutile

TROP DE TEMPS RÉEL

Parfois :

- batch > temps réel

DONNÉES BIAISÉES

Exemple réel :

- logs incomplets
- mauvais tracking
